



Vlaamse
overheid

GIPOD²

Werkgroep prioriteiten na Release 1

INFORMATIE
VLAANDEREN



www.vlaanderen.be/informatievlaanderen

Themawerkgroep prioriteiten

> Agenda

- planning ontwikkeling voor versie 1.0 (API en GUI)
- openstaande punten ontwikkeling
 - > vragen VRN
- openstaande punten ontwikkeling o.b.v overzichtsdocument
- welke zijn prioritair?
- vervolgstappen om tegen 10/11 met een voorstel te komen

Planning voor R1

- > API
 - functional freeze 23/10
 - > inhoud zie volgende slide
 - detail staging/testen/ dry run
 - > bespreking op TWG 23/10
- > Synchronisatie van samenwerkingen
 - oude synergie en SSA overzetten naar nieuwe omgeving obv criteria van de BWG
- > Public API

Planning voor R1

> GUI

- 3 releases voor R1--- > enkel voor zaken die al in API ter beschikking zijn
 - > einde oktober (was al voorzien)
 - grote functionele blokken
 - > einde november (was al voorzien)
 - afgelijnde gehelen
 - > einde december (toegevoegd)
 - verbeteringen
- Eerste Release na R1
 - > einde februari (toegevoegd)
 - verbeteringen (enkel indien geen impact API of al voorzien in API)

Planning voor R1

> API

- status op hinder
- notificaties: structuur taxonomie (ifv. GUI)
- verwijderen hinder
- extra zoekmogelijkheden SSA (ifv. GUI & integratoren)
- wijzigen beheerder inname
- notificaties: alle details in zoekopdracht (vraag integratoren)
- extra zoekmogelijkheden hinder (ifv. GUI & integratoren)
- status “Niet uitgevoerd” op SS (ifv. migratie & verwijderen)
- specificatie verplicht
 - > wordt toegevoegd, over het hoofd gezien
 - > voor en nadelen

Planning voor R1

> API

- status op hinder
- notificaties: structuur taxonomie (ifv. GUI)
- verwijderen hinder
- extra zoekmogelijkheden SSA (ifv. GUI & integratoren)
- wijzigen beheerder inname
- notificaties: alle details in zoekopdracht (vraag integratoren)
- extra zoekmogelijkheden hinder (ifv. GUI & integratoren)
- status “Niet uitgevoerd” op SS (ifv. migratie & verwijderen)
- specificatie verplicht
 - > wordt toegevoegd, over het hoofd gezien
 - > voor en nadelen

Planning voor R1 – BC 34

> GUI

■ November:

- > Conflictdetectie De Lijn
- > Notificaties

■ December

- > GIPOD formulier voor SV

Planning functionaliteiten UI

> Afgerond

- Beheer innames
- Samenwerking

> In ontwikkeling


- Beheer hinder
- Notificaties, kaart

> Gepland voor R1

- Conflictdetectie De Lijn
- Geografisch zoeken

> December

- Signalisatievergunning & verwerken
- Verbeteringen & feedback

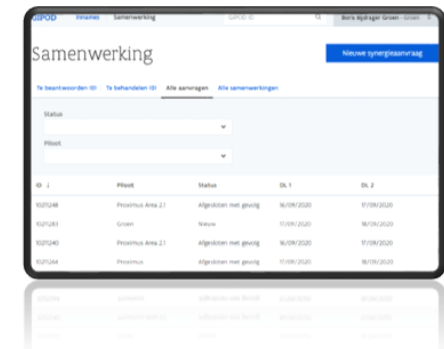

Planning voor R1

> GUI – Vraag VRN

Module	Sectie	Functionaliteit	26/okt	23/nov	23/dec	Februari (na R1)	backlog na R1	nieuw / analyse nodig
Inname	Zoeken	resultaat op kaart				x		
		geografisch zoeken			op gemeente	vrije zone		
	Raadplegen	missing attributes (bijlage, verplaatsingswerk,...)		x				
	Creëren	overzichtslijst geeft niet de beschrijving van het GW						x
		Een inname aanmaken met een punt (XY coördinaat) als zone				x		
		Een inname aanmaken met een ingetekende multi-polygoon als zone				x		
		Een inname aanmaken op basis van een adres				x		
		Een evenement aanmaken met een lijn als zone				x		
		Aangeven dat een grondwerk een verplaatsingswerk is en het veroorzakend grondwerk aanduiden.		x				
		Specificatie verplicht bij cat1 werk						
Wijzigen	Een bijlage toevoegen bij wijziging van een inname.		x					
	in geval van multipolygoon, 1 (of meerdere) polygoon selecteren en verwijderen					x		
Hinder	Zoeken	zoeken hinder (algemeen)		x				
		zoeken 'te behandelen hinder' (voor S&G)		x				
	Raadplegen	detail hinder bekijken bij inname	x					
	Wijzigen	beheren hinder		x				
Kaart	Kaartfunctionaliteiten	wisselen tussen verschillende achtergrondlagen	Beschikbaar bij in tekenen				overall beschikbaar in elke view u dus ook raadplegen	
		context-data weergeven/verbergen op kaart					x	
SSA	Toevoegen GW	kan enkel door ingave GIPOD ID, geen selectie uit lijst					x	
	Verwijderen GW	na positief antwoord en toevoegen GW, GW terug kunnen verwijderen voor DL2	x					
		de onderliggende GW in de SSA zichtbaar maken op de kaart	x					
	Raadplegen	raadplegen van organisaties die SSA zullen krijgen (zonder uitnodiging te versturen)					x	
SSYN	Toevoegen GW	organisatie vraagt piloot om GW toe te voegen					x	
		piloot voegt GW toe voor een andere organisatie	x					
	Raadplegen	tonen SSAid uit dewelke de SSYN werd aangemaakt			x			
		de onderliggende GW in de SSYN zichtbaar maken op de kaart	x					
	Wijzigen	toevoegen/verwijderen GW	x					
	knop om de SSYN zone opnieuw op te bouwen volgens de gekoppelde GW zones						x	
	vraag en klaarzetten toevoegen/verwijderen GW van derde en te bevestigen door piloot						x	
Algemeen	Historiek	historiek wie heeft wat gedaan op welk moment					x	
Notificaties	Raadplegen	notificaties in UI			x			
	Beheer	? Betekenis				x		

Planning

> GUI – Vraag VRN

Module	Sectie	Functionaliteit	26/okt	23/nov	23/dec	Februari (na R1)	backlog na R1	nieuw / analyse nodig	
Vraag voor GW	Aanvraag						x		
	Raadplegen						x		
Project & ProjectAanvraag	alle	PA/project voor project met CV					x		
		PA/project voor project zonder CV					x		
		PA/project voor werk					x		
Jaarvergunning domein vergunning	Aanvraag							x	
	Raadplegen							x	
Jaarvergunning signalisatie vergunning	Aanvraag							x	
	Raadplegen							x	
Start/Stop van de werken							x		
Signalisatievergunning	Aanvraag	via GIPOD aanvraagformulier							x
		via tool S&G							
	Raadplegen							x	

Planning na R1

> Uitbreiding GUI

Advies De Lijn

Export data

Uitbreiding
SSA/SYN

Kaarten/overzichten

> Operationeel beheer

- Interne opvolgtool

Planning na R1

- > API en GUI samen – uitbreiding/afwerking

Historiek

VGW

SSA/SYN

Parkeerverbod

- > API en GUI samen voor nieuwe functies

PA en project

Omleiding

Jaarvergunningen
Domeintoelating

Start en stop
GW/werfzone

Fasering

Jaarvergunningen
signalisatie

Sperperiode

Verdere uitwerking

> Inname

- Registreer werk op adres
- Registreer parkeerverbod
- Registreer als gevolgnaam
- Zone als route
- Voorlopige oplevering
- Start en stop der werken
 - > Relatie met Hinderzone !

> SSA en SYN

- Vraag en GW toe te voegen (stel een GW voor aan de piloot)
- Vraag voor GW op SYN niveau

Verdere uitwerking

- > Hinder
 - Hinder beheren voor een synergie
 - Hinder zonder inname
 - Hinder aan meer dan 1 inname
 - Start en stop van de werfzone (GW en SYN)

- > Public API
 - Ontsluiten Hinder via WFS

- > Notificaties

Nieuwe modules

- > Projecten & Projectaanvraag
 - evenement
 - zonder CV
 - met CV
 - Met werk

- > Omleiding
 - Incl koppeling met VBD

- > SPER periode
 - Berekenen en tonen

Nieuwe modules

- > Vraag voor GW (API 30 % klaar)
- > Ondersteuning jaarvergunning signalisatie
 - Registratie in GIPOD vanuit tool S&G
 - Aanvraag via GIPOD formulier
- > Ondersteuning aanvraag jaarvergunning domeintoelating

Planning

- > 26 oktober EOD: doorsturen visie
 - AIV consolideert en maakt inschatting voor tijdlijn 2021
- > 28 oktober: vervolg werkgroep
 - opmerkingen verwerken
- > 30 oktober stuurt voorstel door ter voorbereiding BWG
- > 10 november: voorstel op BWG bespreken
